# ACCORDO DI PROGRAMMA

## RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

## NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE




**PROVINCIA DI BERGAMO**
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

**COMUNE DI ZANICA**
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

**PROMOTORE**
**Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -


**F - OPERE DI URBANIZZAZIONE**

SCALA

DATA
**SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA
**PREVENTIVO DI MASSIMA**

NUMERO TAVOLA
**F3**

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

## TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

**COMUNE DI ZANICA:**
**UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE**
**Dirigente**
**Dott. arch. Gianluca Della Mea**
**gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it**
**tel. 035 4245811 int 3**

## PROGETTISTI E CONSULENTI


**PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE**

**Marcello Fiorina - ingegnere**
**Elisabetta Nani - ingegnere**
**Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria**
**Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308**
**www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com**

**PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA**

**Studio Gerundo**
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

**RKD**
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

**BEAST Design Studios GmbH**
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

**ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE**

**ETS Engineering and Technical Services SpA**
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

**TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA**

**TE.A. CONSULTING SRL**
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**TE.A. CONSULTING SRL**
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

**H&MV Engineering**
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

# PL Zanica – quadro economico preliminare

| DATI INTERVENTO | |
|---|---|
| Comune | Zanica (BG) |
| Intervento | Piano di Lottizzazione – opere di urbanizzazione |
| Stato | Stima parametrica |

| Categoria | Importo |
|---|---|
| 1. Opere di urbanizzazione viabilità di accesso pubblica e parcheggi pubblici | € 1.301.510,26 |
| 2. Verde attrezzato | € 2.439.500,00 |
| TOTALE | € 3.741.010,26 |

SONO AL MOMENTO NON CONTABILIZZATI I COSTI DELLE RETI SU VIABILITA' ESISTENTE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE ESISTENTI

**Comune di Zanica**
Provincia di Bergamo



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione viabilità di accesso pubblica e parcheggi pubblici in superficie

**COMMITTENTE:**

Milano, 11/09/2026

**IL TECNICO**



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1 / 1 LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50.<br>LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. | 220,00 | | | 0,520 | 114,40 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 114,40 | 19,38 | 2´217,07 |
| 2 / 2 LOM261.1C.27.050.0100.a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:<br>- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010<br>Vedi voce n° 1 [1 m³ 114.40] | | | | 1,500 | 171,60 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 171,60 | 3,97 | 681,25 |
| 3 / 3 LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200.<br>LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.<br>RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. | | | | | 220,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 220,00 | 3,16 | 695,20 |
| 4 / 4 LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250.- | OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura.<br>LAVORO: Formaz ... 0.<br>SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.<br>RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.<br>RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.<br>Vedi voce n° 3 [1 m² 220.00] | | | | 0,300 | 66,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 66,00 | 46,30 | 3´055,80 |
| 5 / 5 LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0540.b | OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazio ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 3 [1 m² 220.00] | | | | | 220,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 220,00 | 28,37 | 6´241,40 |
| 6 / 6 LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.b | OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali \| sede stradale; spessore [cm] = 8.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 3 [1 m² 220.00] | | | | | 220,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 220,00 | 22,73 | 5´000,60 |
| 7 / 7 LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.b | OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60.<br>LAVORO: For ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 17´891,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 17´891,32 |
| | Vedi voce n° 3 [1 m² 220.00] | | | | | 220,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 220,00 | 14,95 | 3´289,00 |
| 8 / 8 LOM261.OC .ITA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.- | OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente \| antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... minerale LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP Traccialinee. SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. | | | | | | | |
| | (lung.=25*3) | | 75,00 | | 0,100 | 7,50 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 7,50 | 7,18 | 53,85 |
| 9 / 9 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 4202.Sa000.0 010.- | OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scat ... classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi LV Posa. | | | | | | | |
| | | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 5,00 | 193,99 | 969,95 |
| 10 / 10 LOM261.1U. 05.220.0010. b | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... la zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm | | | | | | | |
| | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 91,95 | 367,80 |
| 11 / 11 NP.04 | Nuovi sottoservizi fognatura e acquedotto (par.ug.=6000,00+10000) | 16000,00 | | | | 16´000,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 16´000,00 | 1,00 | 16´000,00 |
| 12 / 12 LOM261.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. | | | | | | | |
| | | 330,00 | | | 0,520 | 171,60 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 171,60 | 19,38 | 3´325,61 |
| 13 / 13 LOM261.1C. 27.050.0100. a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 12 [1 m³ 171.60] | | | | 1,500 | 257,40 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 257,40 | 3,97 | 1´021,88 |
| 14 / 14 LOM261.OC .ADA.Pa02. B5700.Oa00 9.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. | | | | | | | |
| | | | | | | 330,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 330,00 | 3,16 | 1´042,80 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 43´962,21 |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 43´962,21 |
| 15 / 15 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0201.Mb002. 0250.- | OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formaz ... 0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Vedi voce n° 14 [1 m² 330.00] | | | | 0,300 | 99,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 99,00 | 46,30 | 4´583,70 |
| 16 / 16 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0900.J0009.0 540.b | OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazio ... monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Vedi voce n° 14 [1 m² 330.00] | | | | | 330,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 330,00 | 28,37 | 9´362,10 |
| 17 / 17 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0901.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali \| sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; ... monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Vedi voce n° 14 [1 m² 330.00] | | | | | 330,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 330,00 | 22,73 | 7´500,90 |
| 18 / 18 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 1201.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: For ... monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Vedi voce n° 14 [1 m² 330.00] | | | | | 330,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 330,00 | 14,95 | 4´933,50 |
| 19 / 19 LOM261.OC .ITA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.- | OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente \| antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... minerale LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP Traccialinee. SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. | | | | | | | |
| | | | 100,00 | | 0,100 | 10,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 10,00 | 7,18 | 71,80 |
| 20 / 20 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 4202.Sa000.0 010.- | OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scat ... classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi LV Posa. | | | | | | | |
| | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 8,00 | 193,99 | 1´551,92 |
| 21 / 21 LOM261.1U. 05.220.0010. b | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... la zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 71´966,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 71´966,13 |
| | - palo antirotazione diametro 60 mm | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 91,95 | 551,70 |
| 22 / 22 NP.04 | Nuovi sottoservizi fognatura e acquedotto (par.ug.=4000,00+7000) | 11000,00 | | | | 11´000,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 11´000,00 | 1,00 | 11´000,00 |
| 23 / 23 LOM261.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. | 2700,00 | | | 0,520 | 1´404,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 1´404,00 | 19,38 | 27´209,52 |
| 24 / 24 LOM261.1C. 27.050.0100. a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 23 [1 m³ 1 404.00] | | | | 1,500 | 2´106,00 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 2´106,00 | 3,97 | 8´360,82 |
| 25 / 25 LOM261.OC .ADA.Pa02. B5700.Oa00 9.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. | | | | | 2´700,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 2´700,00 | 3,16 | 8´532,00 |
| 26 / 26 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0201.Mb002. 0250.- | OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formaz ... 0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Vedi voce n° 25 [1 m² 2 700.00] | | | | 0,300 | 810,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 810,00 | 46,30 | 37´503,00 |
| 27 / 27 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0900.J0009.0 540.b | OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazio ... monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Vedi voce n° 25 [1 m² 2 700.00] | | | | | 2´700,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 2´700,00 | 28,37 | 76´599,00 |
| 28 / 28 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0901.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali \| sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; ... monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Vedi voce n° 25 [1 m² 2 700.00] | | | | | 2´700,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2´700,00 | | 241´722,17 |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | 2´700,00 | | 241´722,17 |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 2´700,00 | 22,73 | 61´371,00 |
| 29 / 29 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 1201.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: For ... monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Vedi voce n° 25 [1 m² 2 700.00] | | | | | 2´700,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 2´700,00 | 14,95 | 40´365,00 |
| 30 / 30 LOM261.OC .ITA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.- | OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente \| antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... minerale LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP Traccialinee. SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. (lung.=110*3+100*2) | | 530,00<br>230,00 | | 0,100 | 53,00<br>230,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 283,00 | 7,18 | 2´031,94 |
| 31 / 31 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 4202.Sa000.0 010.- | OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scat ... classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi LV Posa. | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 15,00 | 193,99 | 2´909,85 |
| 32 / 32 LOM261.1U. 05.220.0010. b | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... la zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 91,95 | 919,50 |
| 33 / 33 LOM261.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. | 70,00 | | | 0,520 | 36,40 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 36,40 | 19,38 | 705,43 |
| 34 / 34 LOM261.1C. 27.050.0100. a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Vedi voce n° 33 [1 m³ 36.40] | | | | 1,500 | 54,60 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 54,60 | 3,97 | 216,76 |
| 35 / 35 LOM261.OC .ADA.Pa02. B5700.Oa00 9.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 350´241,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 350´241,65 |
| | sollevamento. | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 70,00 | 3,16 | 221,20 |
| 36 / 36 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0201.Mb002. 0250.- | OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura.<br>LAVORO: Formaz ... 0.<br>SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.<br>RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.<br>RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.<br>Vedi voce n° 35 [1 m² 70.00] | | | | 0,300 | 21,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 21,00 | 46,30 | 972,30 |
| 37 / 37 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0900.J0009.0 540.b | OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazio ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 35 [1 m² 70.00] | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 70,00 | 28,37 | 1´985,90 |
| 38 / 38 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0901.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali \| sede stradale; spessore [cm] = 8.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 35 [1 m² 70.00] | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 70,00 | 22,73 | 1´591,10 |
| 39 / 39 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 1201.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60.<br>LAVORO: For ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 35 [1 m² 70.00] | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 70,00 | 14,95 | 1´046,50 |
| 40 / 40 LOM261.OC .ITA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.- | OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente \| antisdrucciolevole; impiego: strade.<br>LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... minerale<br>LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.<br>RP Traccialinee.<br>SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.<br>(lung.=15*3) | | 45,00 | | 0,100 | 4,50 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 4,50 | 7,18 | 32,31 |
| 41 / 41 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 4202.Sa000.0 010.- | OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade.<br>LAVORO: Posa.<br>SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scat ... classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi<br>LV Posa. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 4,00 | 193,99 | 775,96 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 356´866,92 |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 356´866,92 |
| 42 / 42 LOM261.1U. 05.220.0010. b | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... la zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:<br>- palo antirotazione diametro 60 mm | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 91,95 | 275,85 |
| 43 / 43 LOM261.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50.<br>LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. | 1950,00 | | | 0,520 | 1´014,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 1´014,00 | 19,38 | 19´651,32 |
| 44 / 44 LOM261.1C. 27.050.0100. a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:<br>- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010<br>Vedi voce n° 43 [1 m³ 1 014.00] | | | | 1,500 | 1´521,00 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 1´521,00 | 3,97 | 6´038,37 |
| 45 / 45 LOM261.OC .ADA.Pa02. B5700.Oa00 9.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200.<br>LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.<br>RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. | | | | | 1´950,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 1´950,00 | 3,16 | 6´162,00 |
| 46 / 46 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0201.Mb002. 0250.- | OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura.<br>LAVORO: Formaz ... 0.<br>SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.<br>RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.<br>RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.<br>Vedi voce n° 45 [1 m² 1 950.00] | | | | 0,300 | 585,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 585,00 | 46,30 | 27´085,50 |
| 47 / 47 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0900.J0009.0 540.b | OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazio ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 45 [1 m² 1 950.00] | | | | | 1´950,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 1´950,00 | 28,37 | 55´321,50 |
| 48 / 48 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0901.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali \| sede stradale; spessore [cm] = 8.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 45 [1 m² 1 950.00] | | | | | 1´950,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 1´950,00 | 22,73 | 44´323,50 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 515´724,96 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 515´724,96 |
| 49 / 49 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 1201.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60.<br>LAVORO: For ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 45 [1 m² 1 950.00] | | | | | 1´950,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 1´950,00 | 14,95 | 29´152,50 |
| 50 / 50 LOM261.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50.<br>LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.<br>(par.ug.=16,1*100) | 1610,00 | | | 0,500 | 805,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 805,00 | 19,38 | 15´600,90 |
| 51 / 51 LOM261.1C. 27.050.0100. a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:<br>- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010<br>Vedi voce n° 50 [1 m³ 805.00] | | | | 1,500 | 1´207,50 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 1´207,50 | 3,97 | 4´793,78 |
| 52 / 52 LOM261.OC .ADA.Pa02. B5700.Oa00 9.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200.<br>LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.<br>RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. | | | | | 805,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 805,00 | 3,16 | 2´543,80 |
| 53 / 53 LOM261.OC .EEA.Pa04.C 0910.Mb000. 0250.- | OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: intasamento, sistemazi ... eso [t] = 1,9.<br>SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato.<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.<br>Vedi voce n° 52 [1 m² 805.00] | | | | 0,300 | 241,50 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 241,50 | 49,89 | 12´048,44 |
| 54 / 54 LOM261.OC .EEA.Pa04.C 0910.Mb000. 0500.- | OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. OP St ... ata; impiego: sede stradale.<br>RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.<br>SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.<br>Vedi voce n° 52 [1 m² 805.00] | | | | | 805,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 805,00 | 11,64 | 9´370,20 |
| 55 / 55 LOM261.RM .00.10.05.Mb 001.0500.c | Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 18<br>Vedi voce n° 52 [1 m² 805.00] | | | | 0,080 | 64,40 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 64,40 | 23,63 | 1´521,77 |
| 56 / 56 LOM261.OC | OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 590´756,35 |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 590´756,35 |
| .EEA.Pa02.C 1206.J0005.0 045.- | "doppio strato quarzo"; impi ... o: lame (bull, tilt, angle).<br>RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.<br>Vedi voce n° 52 [1 m² 805.00] | | | | | 805,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 805,00 | 44,23 | 35´605,15 |
| 57 / 57 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 3007.J0005.0 000.- | OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 \| altezza [cm] = 25.<br>LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fo ... escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.<br>(par.ug.=120*6) | 720,00 | | | | 720,00 | | |
| | SOMMANO 1 m | | | | | 720,00 | 24,45 | 17´604,00 |
| 58 / 58 NP.05 | Area verde | | | | | 45´000,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 45´000,00 | 1,00 | 45´000,00 |
| 59 / 59 LOM261.OC .ITA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.- | OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente \| antisdrucciolevole; impiego: strade.<br>LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... minerale<br>LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.<br>RP Traccialinee.<br>SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.<br>(lung.=125*3+104*3+20*3+22*3) | | 813,00 | | 0,100 | 81,30 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 81,30 | 7,18 | 583,73 |
| 60 / 60 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 4202.Sa000.0 010.- | OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade.<br>LAVORO: Posa.<br>SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scat ... classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi<br>LV Posa. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 20,00 | 193,99 | 3´879,80 |
| 61 / 61 LOM261.1U. 05.220.0010. b | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... la zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:<br>- palo antirotazione diametro 60 mm | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 91,95 | 1´103,40 |
| 62 / 62 NP.02 PP1 | Impianto rete meteorica | | | | | 186´426,68 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 186´426,68 | 1,00 | 186´426,68 |
| 63 / 63 NP.03 PP1 | Impianto illuminazione pubblica | | | | | 55´000,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 55´000,00 | 1,00 | 55´000,00 |
| 64 / 64 NP.04 | Nuovi sottoservizi fognatura e acquedotto<br>(par.ug.=2000,00+4000) | 6000,00 | | | | 6´000,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 6´000,00 | 1,00 | 6´000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 941´959,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 941´959,11 |
| 65 / 65 LOM261.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50.<br>LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. | 600,00 | | | 0,520 | 312,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 312,00 | 19,38 | 6´046,56 |
| 66 / 66 LOM261.1C. 27.050.0100. a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:<br>- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010<br>Vedi voce n° 65 [1 m³ 312.00] | | | | 1,500 | 468,00 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 468,00 | 3,97 | 1´857,96 |
| 67 / 67 LOM261.OC .ADA.Pa02. B5700.Oa00 9.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200.<br>LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.<br>RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. | | | | | 600,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 600,00 | 3,16 | 1´896,00 |
| 68 / 68 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0201.Mb002. 0250.- | OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura.<br>LAVORO: Formaz ... 0.<br>SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.<br>RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.<br>RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.<br>Vedi voce n° 67 [1 m² 600.00] | | | | 0,300 | 180,00 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 180,00 | 46,30 | 8´334,00 |
| 69 / 69 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0900.J0009.0 540.b | OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazio ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 67 [1 m² 600.00] | | | | | 600,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 600,00 | 28,37 | 17´022,00 |
| 70 / 70 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 0901.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali \| sede stradale; spessore [cm] = 8.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 67 [1 m² 600.00] | | | | | 600,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 600,00 | 22,73 | 13´638,00 |
| 71 / 71 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 1201.J0009.0 000.b | OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60.<br>LAVORO: For ... monotamburo.<br>RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.<br>RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.<br>Vedi voce n° 67 [1 m² 600.00] | | | | | 600,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 600,00 | | 990´753,63 |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | 600,00 | | 990´753,63 |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 600,00 | 14,95 | 8´970,00 |
| 72 / 72 LOM261.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0005.- | OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50.<br>LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.<br>(par.ug.=16,1*31) | 499,10 | | | 0,500 | 249,55 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 249,55 | 19,38 | 4´836,28 |
| 73 / 73 LOM261.1C. 27.050.0100. a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:<br>- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010<br>Vedi voce n° 72 [1 m³ 249.55] | | | | 1,500 | 374,33 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 374,33 | 3,97 | 1´486,09 |
| 74 / 74 LOM261.OC .ADA.Pa02. B5700.Oa00 9.0250.a | OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200.<br>LAVORO: Posa co ... potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.<br>RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. | | | | | 499,10 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 499,10 | 3,16 | 1´577,16 |
| 75 / 75 LOM261.OC .EEA.Pa04.C 0910.Mb000. 0250.- | OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: intasamento, sistemazi ... eso [t] = 1,9.<br>SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato.<br>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.<br>Vedi voce n° 74 [1 m² 499.10] | | | | 0,300 | 149,73 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 149,73 | 49,89 | 7´470,03 |
| 76 / 76 LOM261.OC .EEA.Pa04.C 0910.Mb000. 0500.- | OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. OP St ... ata; impiego: sede stradale.<br>RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.<br>SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.<br>Vedi voce n° 74 [1 m² 499.10] | | | | | 499,10 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 499,10 | 11,64 | 5´809,52 |
| 77 / 77 LOM261.RM .00.10.05.Mb 001.0500.c | Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 18<br>Vedi voce n° 74 [1 m² 499.10] | | | | 0,080 | 39,93 | | |
| | SOMMANO 1 m³ | | | | | 39,93 | 23,63 | 943,55 |
| 78 / 78 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.J0005.0 045.- | OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impi ... o: lame (bull, tilt, angle).<br>RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.<br>Vedi voce n° 74 [1 m² 499.10] | | | | | 499,10 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 499,10 | 44,23 | 22´075,19 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1´043´921,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1´043´921,45 |
| 79 / 79 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 3007.J0005.0 000.- | OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 \| altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fo ... escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. (par.ug.=37*6) | 222,00 | | | | 222,00 | | |
| | SOMMANO l m | | | | | 222,00 | 24,45 | 5´427,90 |
| 80 / 80 NP.05 | Area verde | | | | | 35´000,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 35´000,00 | 1,00 | 35´000,00 |
| 81 / 81 LOM261.OC .ITA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.- | OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente \| antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... minerale LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP Traccialinee. SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. (lung.=25*3+50*3) | | 225,00 | | 0,100 | 22,50 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 22,50 | 7,18 | 161,55 |
| 82 / 82 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 4202.Sa000.0 010.- | OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scat ... classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi LV Posa. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO 1 m² | | | | | 10,00 | 193,99 | 1´939,90 |
| 83 / 83 LOM261.1U. 05.220.0010. b | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... la zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 91,95 | 735,60 |
| 84 / 84 NP.02 PP2 | Impianto rete meteorica | | | | | 174´323,86 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 174´323,86 | 1,00 | 174´323,86 |
| 85 / 85 NP.03 PP2 | Impianto illuminazione pubblica | | | | | 40´000,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 40´000,00 | 1,00 | 40´000,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 1´301´510,26 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 1´301´510,26 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |




| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | |
| | **Riepilogo Strutturale CATEGORIE** | | |
| M | **LAVORI A MISURA euro** | 1´301´510,26 | 100,000 |
| M:001 | SP1 euro | 38´571,92 | 2,964 |
| M:001.001 | Strada euro | 21´180,32 | 1,627 |
| M:001.004 | Segnaletica euro | 1´391,60 | 0,107 |
| M:001.005 | Sottoservizi euro | 16´000,00 | 1,229 |
| M:001.005.003 | Rete acquedotto e fognatura nera euro | 16´000,00 | 1,229 |
| M:002 | SP2 euro | 44´945,91 | 3,453 |
| M:002.001 | Strada euro | 31´770,49 | 2,441 |
| M:002.004 | Segnaletica euro | 2´175,42 | 0,167 |
| M:002.005 | Sottoservizi euro | 11´000,00 | 0,845 |
| M:002.005.003 | Rete acquedotto e fognatura nera euro | 11´000,00 | 0,845 |
| M:003 | SP3 euro | 265´801,63 | 20,423 |
| M:003.001 | Strada euro | 259´940,34 | 19,972 |
| M:003.004 | Segnaletica euro | 5´861,29 | 0,450 |
| M:004 | SP4 euro | 7´823,31 | 0,601 |
| M:004.001 | Strada euro | 6´739,19 | 0,518 |
| M:004.004 | Segnaletica euro | 1´084,12 | 0,083 |
| M:005 | PP1 euro | 584´816,34 | 44,934 |
| M:005.001 | Strada euro | 187´734,69 | 14,424 |
| M:005.002 | Stalli auto euro | 99´088,04 | 7,613 |
| M:005.003 | Area verde euro | 45´000,00 | 3,458 |
| M:005.004 | Segnaletica euro | 5´566,93 | 0,428 |
| M:005.005 | Sottoservizi euro | 247´426,68 | 19,011 |
| M:005.005.001 | Rete meteorica euro | 186´426,68 | 14,324 |
| M:005.005.002 | Rete illuminazione pubblica euro | 55´000,00 | 4,226 |
| M:005.005.003 | Rete acquedotto e fognatura nera euro | 6´000,00 | 0,461 |
| M:006 | PP2 euro | 359´551,15 | 27,626 |
| M:006.001 | Strada euro | 57´764,52 | 4,438 |
| M:006.002 | Stalli auto euro | 49´625,72 | 3,813 |
| M:006.003 | Area verde euro | 35´000,00 | 2,689 |
| M:006.004 | Segnaletica euro | 2´837,05 | 0,218 |
| M:006.005 | Sottoservizi euro | 214´323,86 | 16,467 |
| M:006.005.001 | Rete meteorica euro | 174´323,86 | 13,394 |
| M:006.005.002 | Rete illuminazione pubblica euro | 40´000,00 | 3,073 |
| | **TOTALE euro** | 1´301´510,26 | 100,000 |

Milano, 11/09/2026

**Il Tecnico**


| | A R I P O R T A R E | | |
|---|---|---|---|

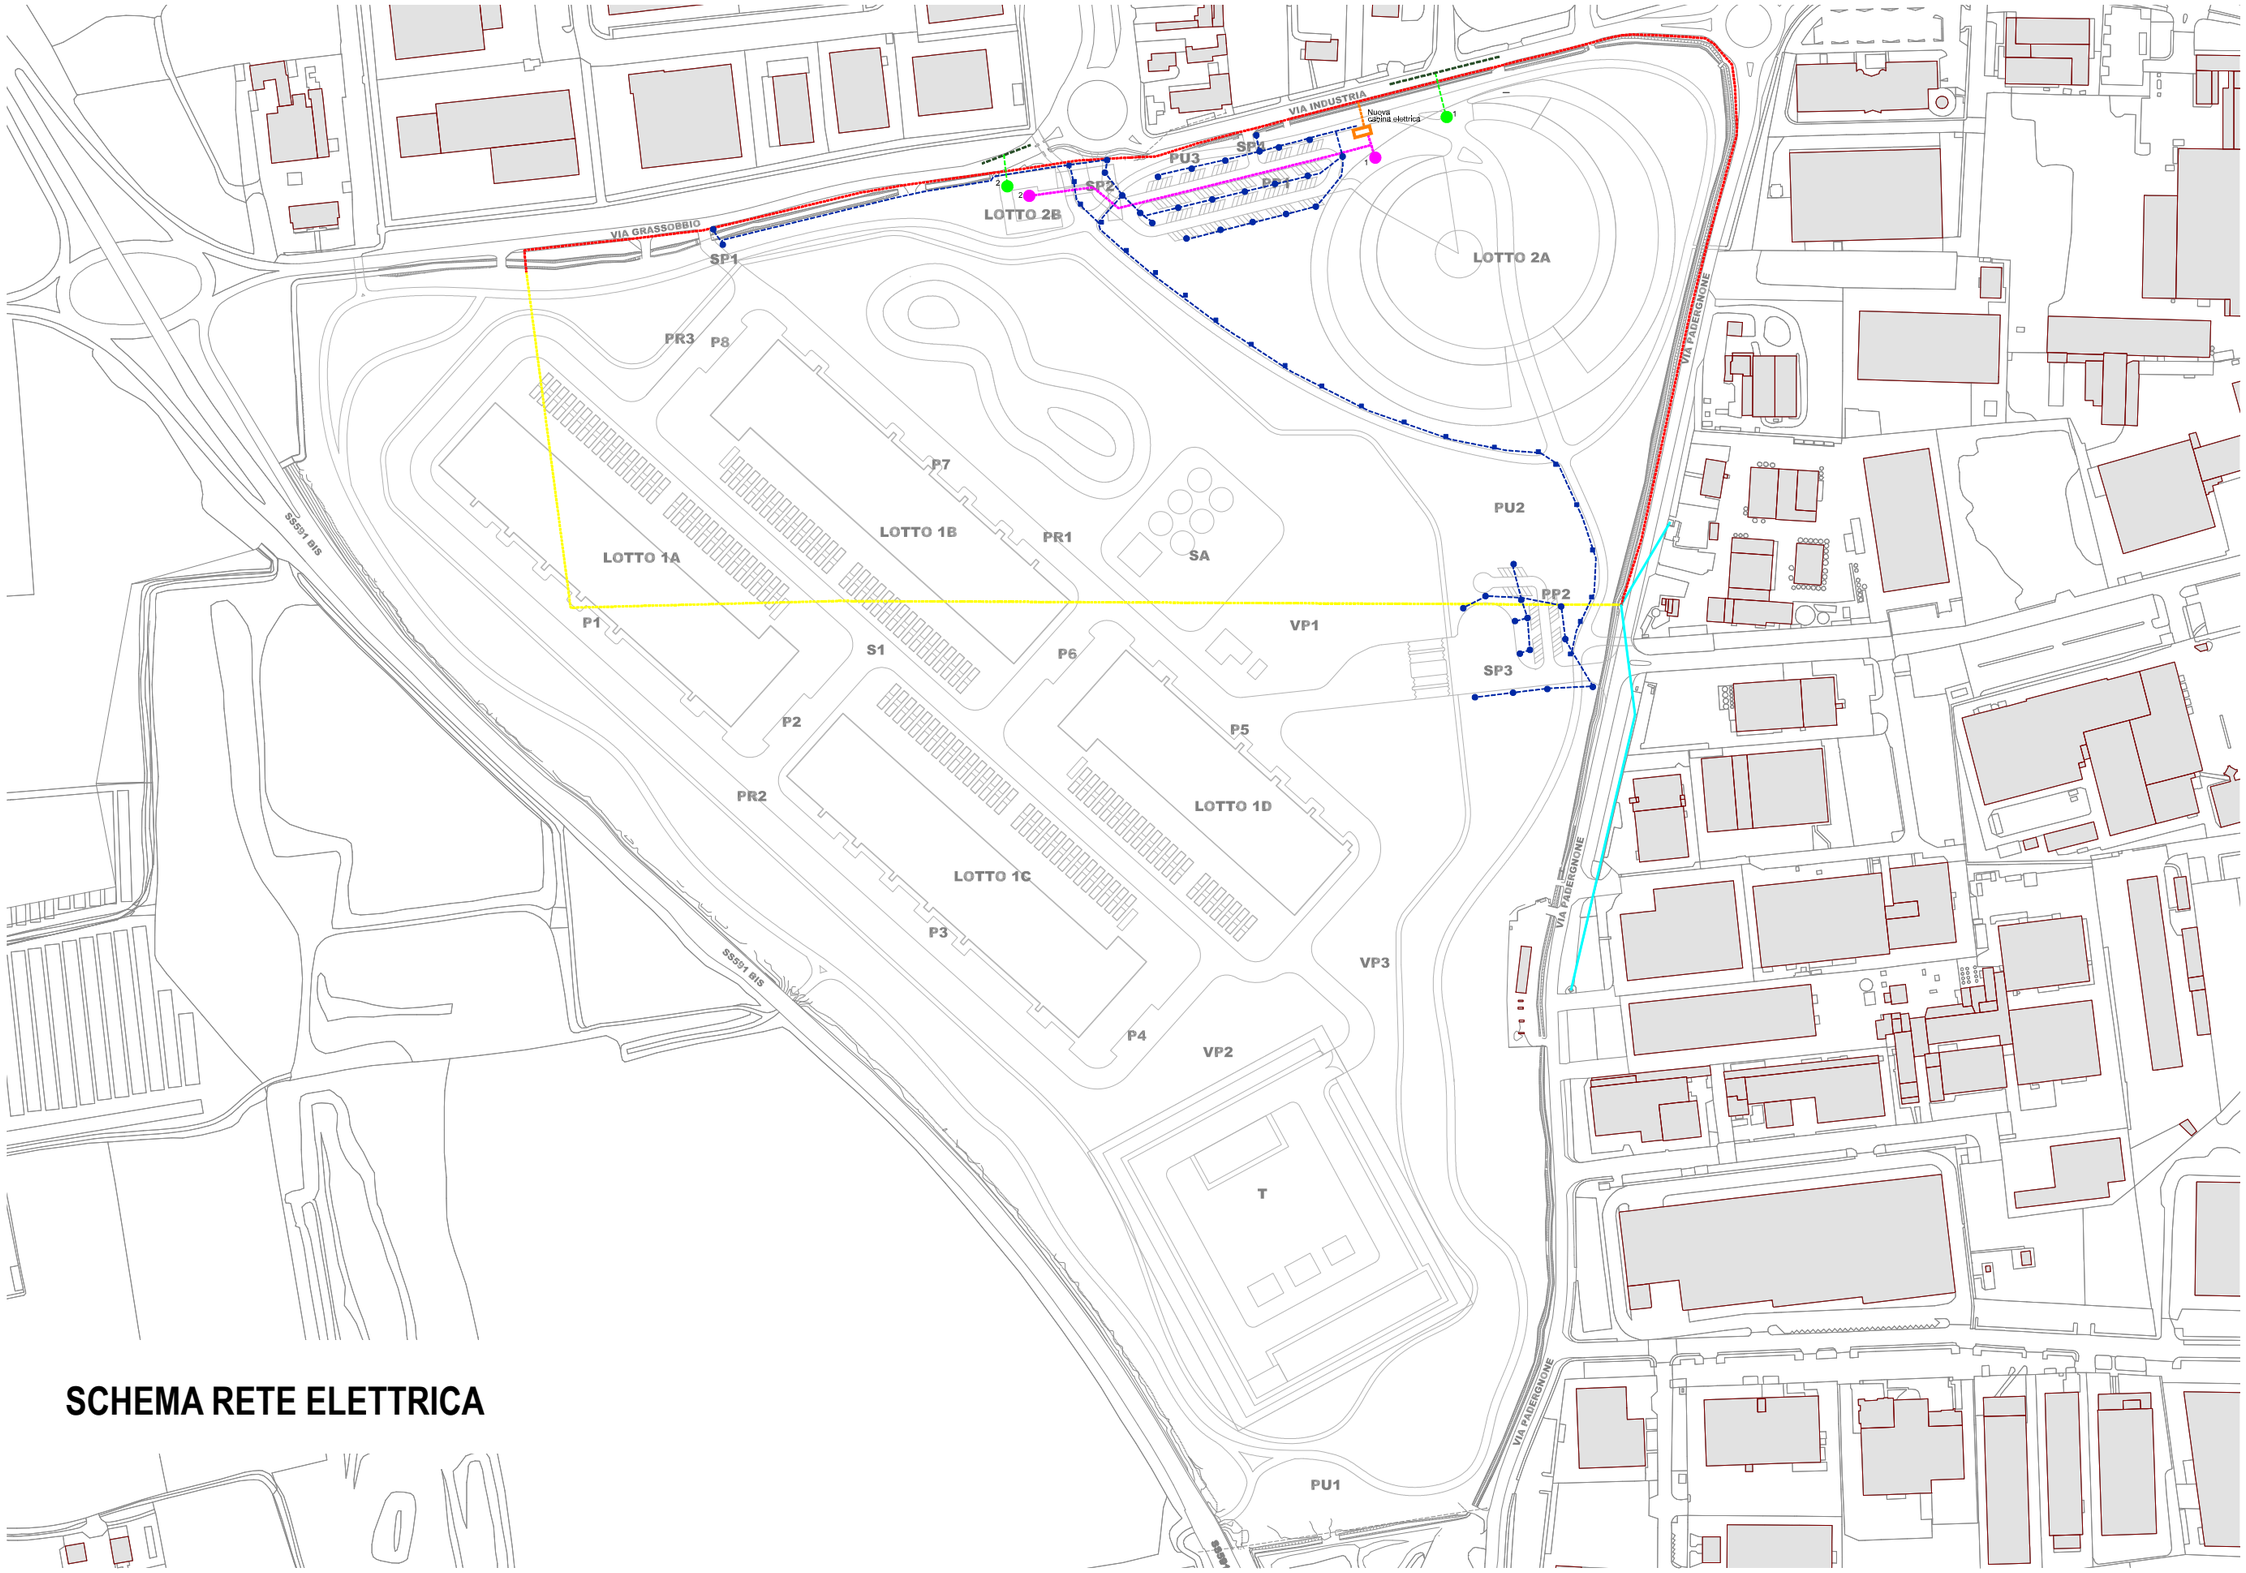


## SCHEMA RETE ELETTRICA




## SCHEMA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA

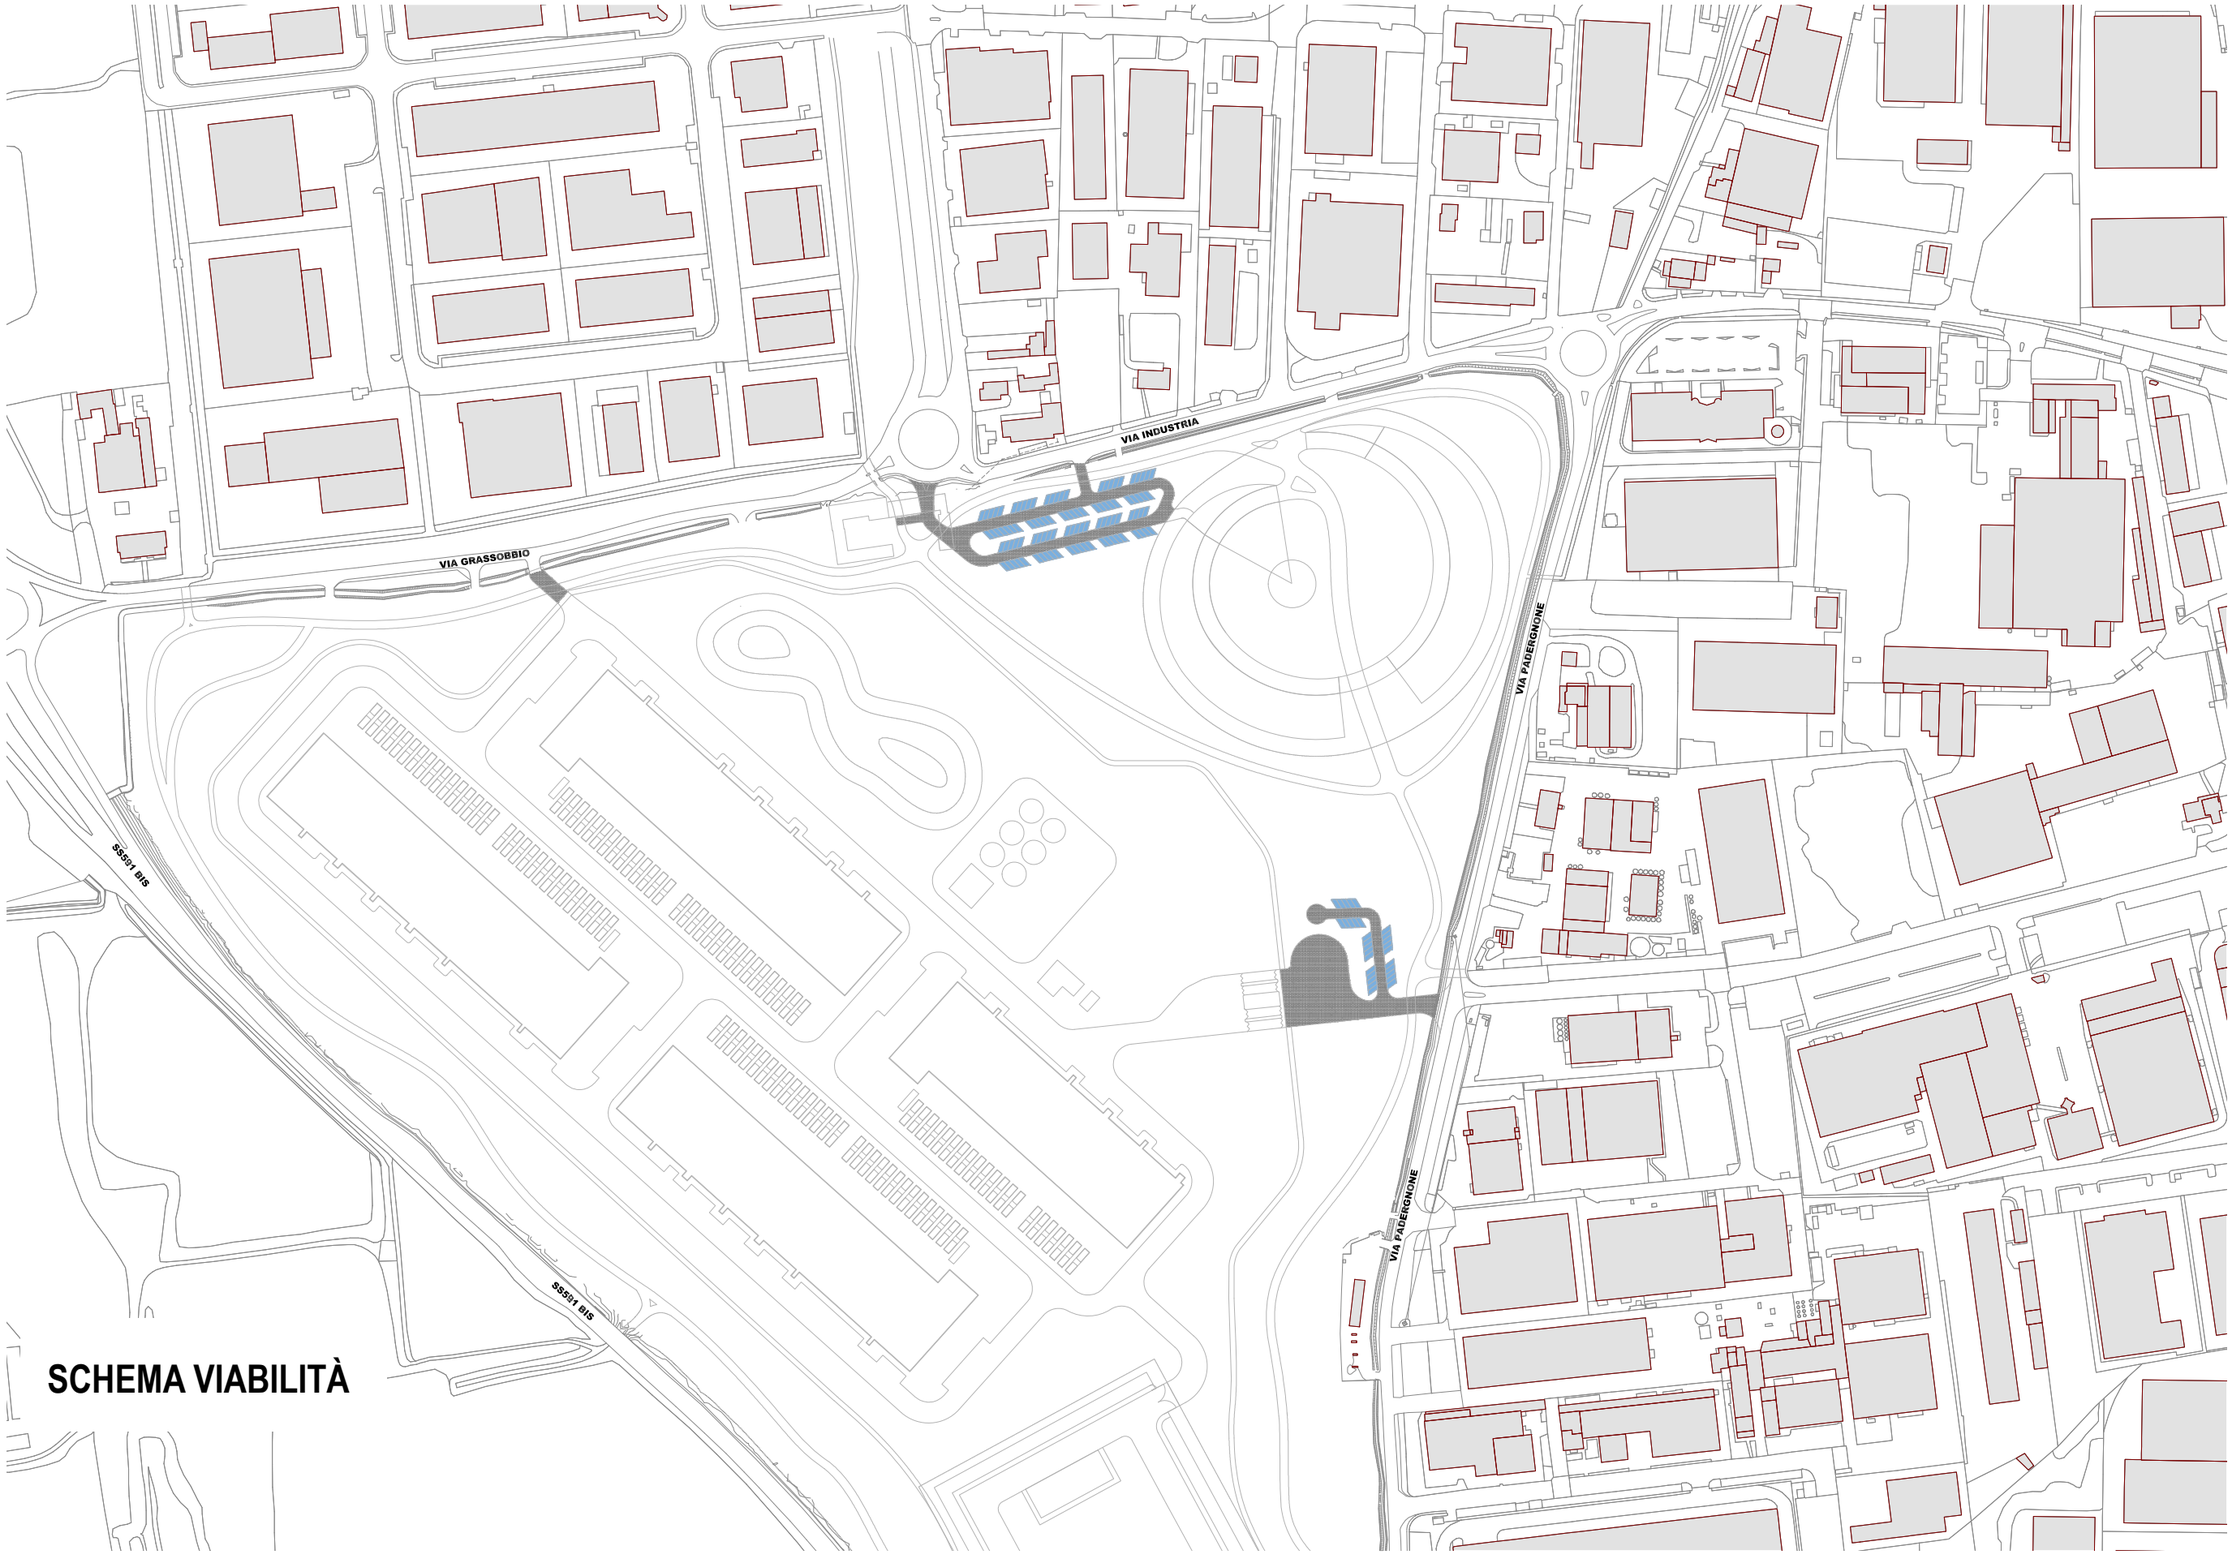



## SCHEMA VIABILITÀ

# Computo metrico estimativo: verde attrezzatc

| ID | Categoria | Lavorazione | U.M. | Prezzo unitario | Quantità | Importo | Tipo prezzo | Codice / riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 2. Verde attrezzato | Movimenti terra dossi e fossi | mc | € 20,00 | 10.000,00 | € 200.000,00 | | |
| 2.02 | 2. Verde attrezzato | Prato campestre | ha | € 3.000,00 | 1,50 | € 4.500,00 | | |
| 2.03 | 2. Verde attrezzato | Prato fiorito | ha | € 4.000,00 | 1,50 | € 6.000,00 | | |
| 2.04 | 2. Verde attrezzato | Bosco mesofilo/termofilo | ha | € 30.000,00 | 12,20 | € 366.000,00 | | |
| 2.05 | 2. Verde attrezzato | Siepe arbusteto | ha | € 40.000,00 | 4,00 | € 160.000,00 | | |
| 2.06 | 2. Verde attrezzato | Telo pacciamante | m² | € 2,00 | 35.000,00 | € 70.000,00 | | |
| 2.07 | 2. Verde attrezzato | SUDS/laminazione idraulica | ha | € 80.000,00 | 1,50 | € 120.000,00 | | |
| 2.08 | 2. Verde attrezzato | Graminacee | ha | € 125.000,00 | 0,50 | € 62.500,00 | | |
| 2.09 | 2. Verde attrezzato | Frutteto | ha | € 35.000,00 | 2,00 | € 70.000,00 | | |
| 2.10 | 2. Verde attrezzato | Irrigazione frutteto | ha | € 18.000,00 | 2,00 | € 36.000,00 | | |
| 2.11 | 2. Verde attrezzato | Filare arboreo (pronto effetto) | cad | € 1.000,00 | 40,00 | € 40.000,00 | | |
| 2.12 | 2. Verde attrezzato | Opere accessorie minori | corpo | € 50.000,00 | 1,00 | € 50.000,00 | | |
| 2.13 | 2. Verde attrezzato | Arredo di ingegneria naturalistica | corpo | € 50.000,00 | 1,00 | € 50.000,00 | | |
| 2.14 | 2. Verde attrezzato | Preparazioni del terreno | ha | € 5.000,00 | 20,00 | € 100.000,00 | | |
| 2.15 | 2. Verde attrezzato | Arredi per la fruizione campestre | corpo | € 80.000,00 | 1,00 | € 80.000,00 | | |
| 2.16 | 2. Verde attrezzato | Vasche per invarianza idraulica | mc | € 30,00 | 25.000,00 | € 750.000,00 | | |
| 2.17 | 2. Verde attrezzato | Manutenzione primi tre anni – sfalci prati | ha | € 3.000,00 | 69,00 | € 207.000,00 | | |
| 2.18 | 2. Verde attrezzato | Manutenzione primi tre anni – essenze forestali | ha | € 1.500,00 | 45,00 | € 67.500,00 | | |
| TOTALE | VERDE ATTREZZATO | | | | | € 2.439.500,00 | | |

# Basi prezzo: verde attrezzato

| ID | Lavorazione | Tariffa 1 | Coeff. 1 | Tariffa 2 | Coeff. 2 | Tariffa 3 | Coeff. 3 | U.M. | Prezzo adottato | Tipo prezzo | Codice / riferimento | Assunzione tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Movimenti terra dossi e fossi | 20,00 | 1,00 | — | — | — | — | mc | € 20,00 | | | |
| 2.02 | Prato campestre | 3.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 3.000,00 | | | |
| 2.03 | Prato fiorito | 4.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 4.000,00 | | | |
| 2.04 | Bosco mesofilo/termofilo | 30.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 30.000,00 | | | |
| 2.05 | Siepe arbusteto | 40.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 40.000,00 | | | |
| 2.06 | Telo pacciamante | 2,00 | 1,00 | — | — | — | — | $m^2$ | € 2,00 | | | |
| 2.07 | SUDS/laminazione idraulica | 80.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 80.000,00 | | | |
| 2.08 | Graminacee | 125.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 125.000,00 | | | |
| 2.09 | Frutteto | 35.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 35.000,00 | | | |
| 2.10 | pavimentazione stradale completa | 18.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 18.000,00 | | | |
| 2.11 | Filare arboreo (pronto effetto) | 1.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | cad | € 1.000,00 | | | |
| 2.12 | Opere accessorie minori | 50.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | corpo | € 50.000,00 | | | |
| 2.13 | Arredo di ingegneria naturalistica | 50.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | corpo | € 50.000,00 | | | |
| 2.14 | Preparazioni del terreno | 5.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 5.000,00 | | | |
| 2.15 | Arredi per la fruizione campestre | 80.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | corpo | € 80.000,00 | | | |
| 2.16 | Vasche per invarianza idraulica | 30,00 | 1,00 | — | — | — | — | mc | € 30,00 | | | |
| 2.17 | Manutenzione primi tre anni – sfalci prati | 3.000,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 3.000,00 | | | |
| 2.18 | Manutenzione primi tre anni – essenze forestali | 1.500,00 | 1,00 | — | — | — | — | ha | € 1.500,00 | | | |

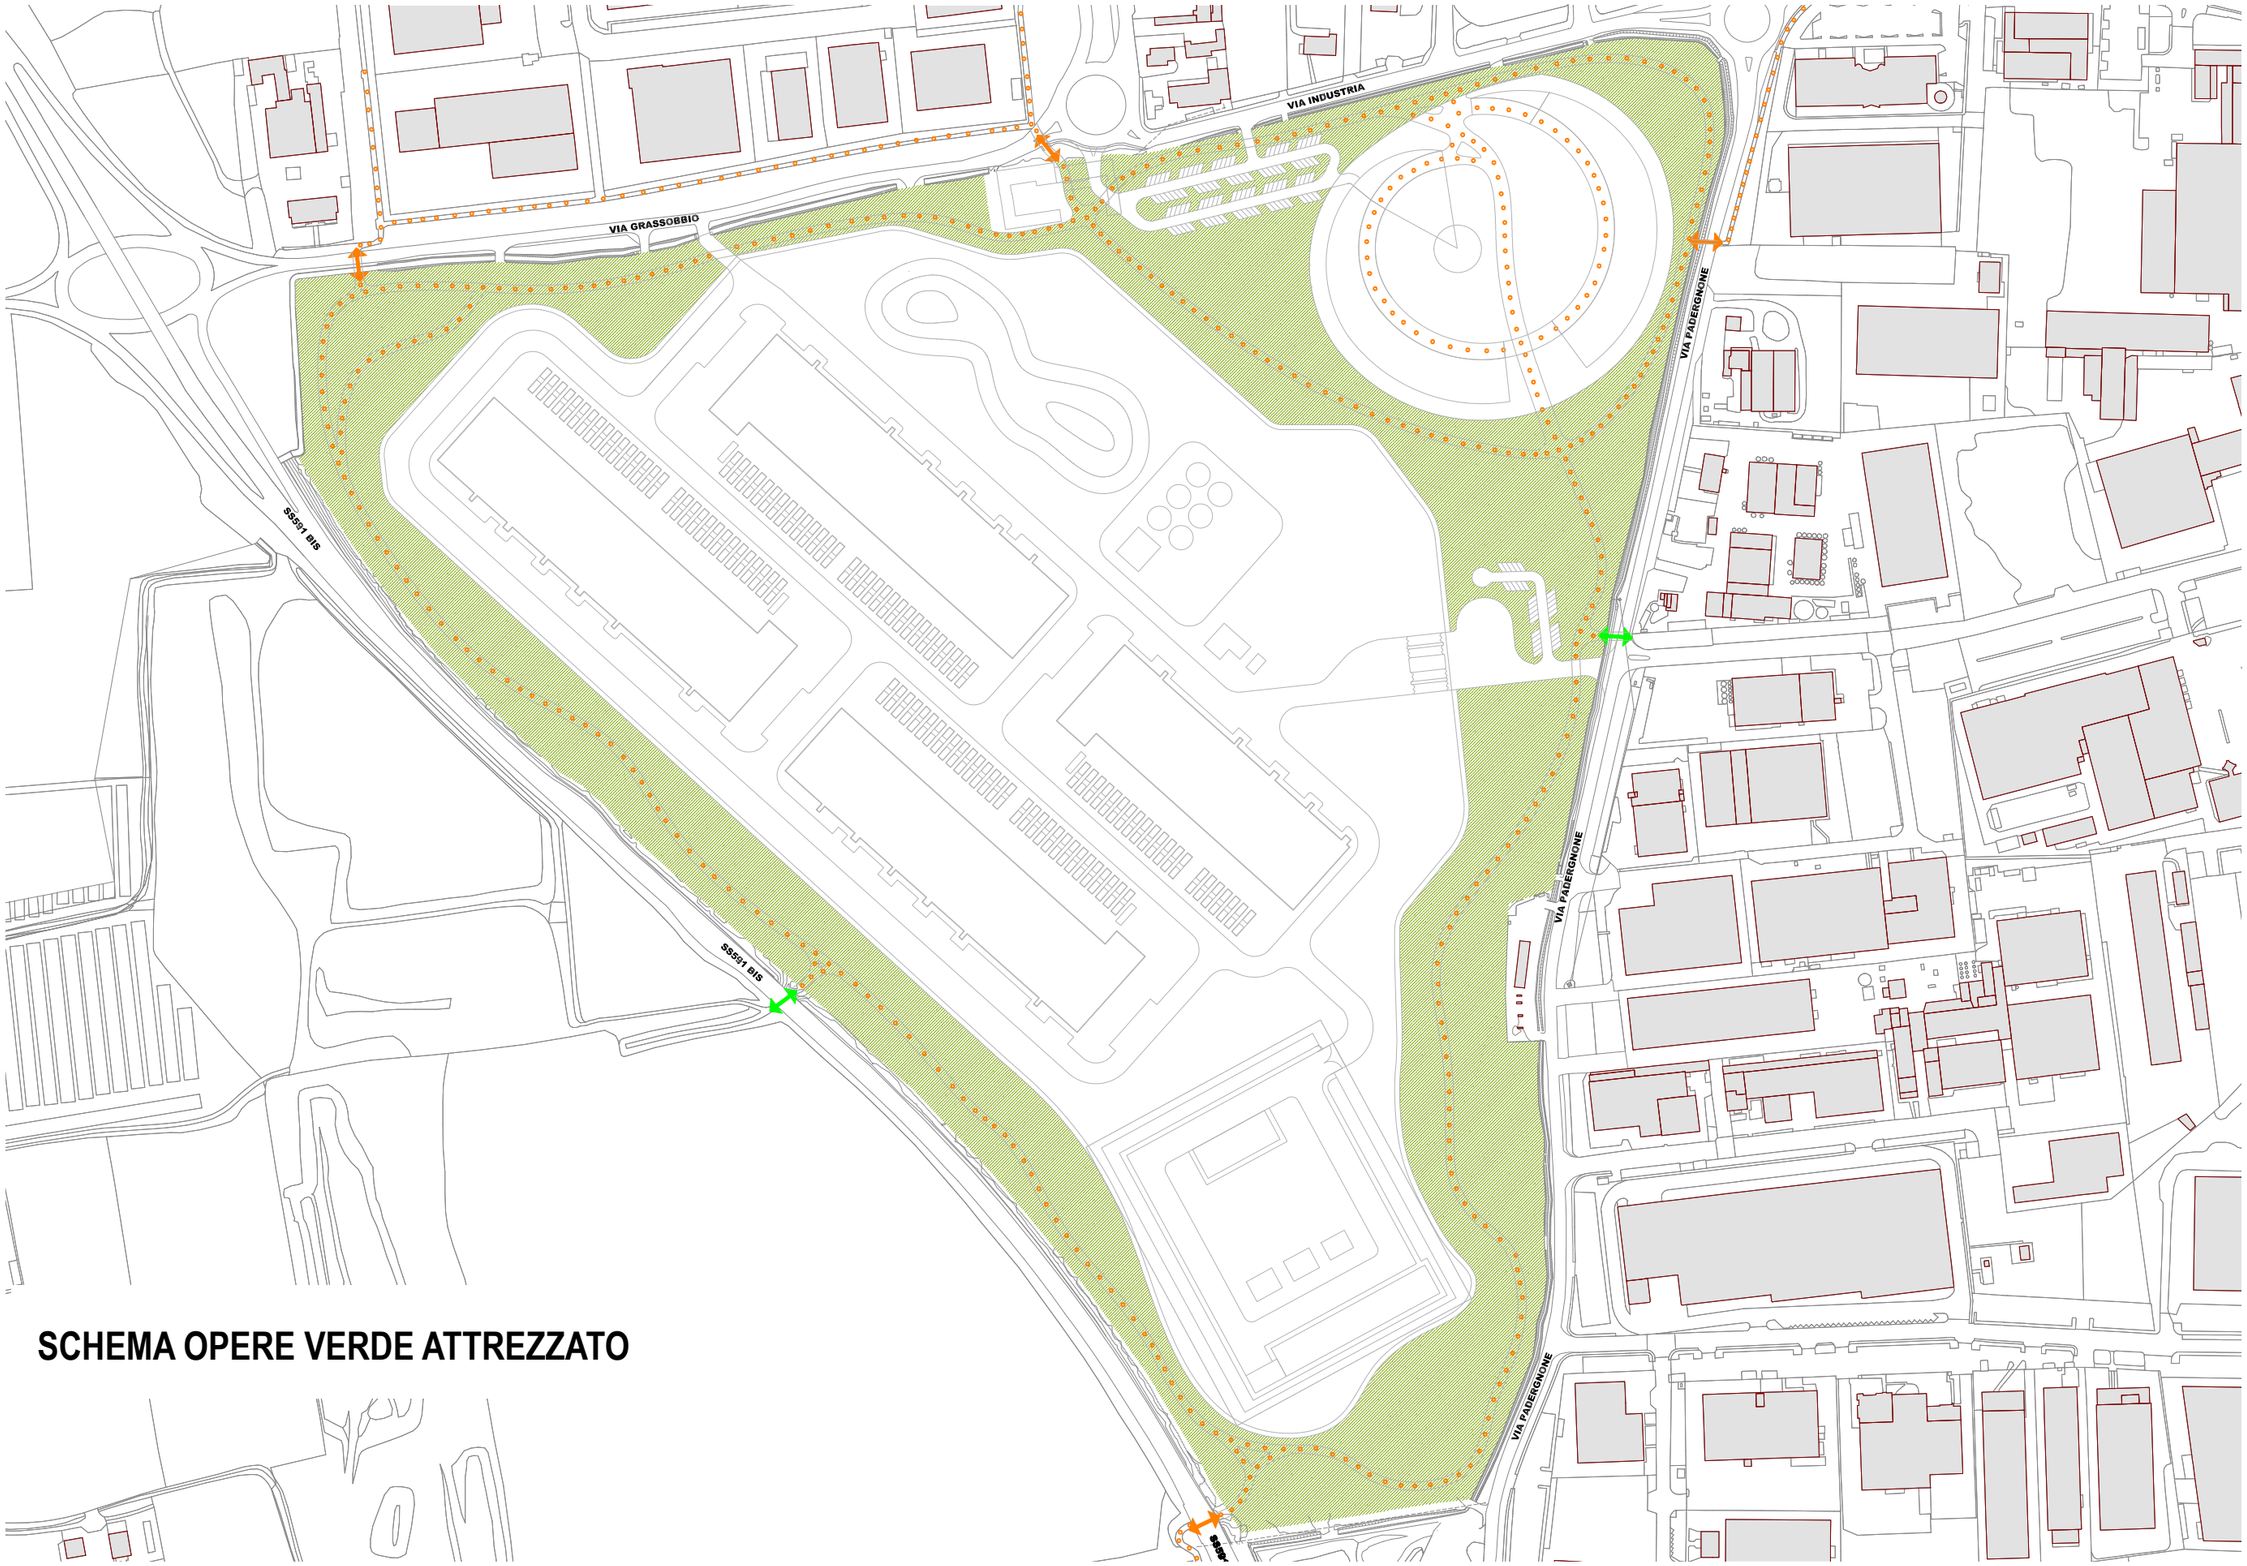


## SCHEMA OPERE VERDE ATTREZZATO
