ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

D - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

SCALA

DATA **SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA

CRONOPROGRAMMA

NUMERO TAVOLA **D9.2**

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Piano Attuativo AT1 - Comune di Zanica (BG) | T0 = stipula della convenzione
Elaborato [●] "Cronoprogramma dei lavori" - art. 12, comma 2.
Natura meramente indicativa e programmatica ai sensi dell'art. [●] della convenzione.

WBS	Attività / Milestone	Componente	Tipo	Inizio (T)	Durata (trim.)	Fine (T)	Riferimento convenzionale	Vincolo / precedenza
0	**ADEMPIMENTI PRELIMINARI E TRASVERSALI**	**Adempimenti trasversali**	**G**	**1**	**5**	**5**		
0.1	Stipula, registrazione e trascrizione della convenzione	Adempimenti trasversali	M	1		1	art. 3, c. 1; art. 12, c. 1	T0 = decorrenza di tutti i termini convenzionali
0.2	Prestazione delle garanzie fideiussorie	Adempimenti trasversali	M	1		1	art. 15, cc. 1 e 2	Contestuale alla sottoscrizione
0.3	Versamento del contributo volontario	Adempimenti trasversali	M	5		5	art. 8, c. 10	Entro il rilascio del primo titolo esecutivo
0.4	Progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione	Adempimenti trasversali	A	3	3	5	art. 9, c. 5	Da presentare prima dell'inizio dei relativi lavori
1	**LOTTO 1 - DATA CENTER**	**Lotto 1 Data Center**	**G**	**3**	**36**	**38**		
1.1	Bonifica del lotto e certificazione di avvenuta bonifica	Lotto 1 Data Center	A	5	3	7	art. 7, cc. 1 e 2	Presupposto inderogabile per l'avvio dei lavori
1.2	Fase 1 - Edificio 1: progettazione esecutiva	Lotto 1 Data Center	A	3	3	5	art. [●], c. 6, lett. a)	
1.3	Fase 1 - Edificio 1: istanza e rilascio del titolo abilitativo	Lotto 1 Data Center	A	6	2	7	art. 12, c. 1	Attiva la quota di contributo volontario e standard qualitativo
1.4	Fase 1 - Edificio 1: realizzazione opere interne	Lotto 1 Data Center	A	8	5	12	art. 7, c. 2	Avvio solo dopo certificazione di bonifica
1.5	Fase 1 - Edificio 1: SCIA di agibilità	Lotto 1 Data Center	M	13		13	art. 7, c. 3	
1.6	Fase 2 - Edificio 2: progettazione esecutiva	Lotto 1 Data Center	A	9	3	11	art. [●], c. 6, lett. b)	Ordine e consistenza delle fasi modificabili
1.7	Fase 2 - Edificio 2: istanza e rilascio del titolo abilitativo	Lotto 1 Data Center	A	12	2	13	art. 12, c. 1	Attiva la quota di contributo volontario e standard qualitativo
1.8	Fase 2 - Edificio 2: realizzazione opere interne	Lotto 1 Data Center	A	14	5	18	art. 7, c. 2	Avvio solo dopo certificazione di bonifica
1.9	Fase 2 - Edificio 2: SCIA di agibilità	Lotto 1 Data Center	M	19		19	art. 7, c. 3	Richiede urbanizzazioni funzionali collaudate
1.10	Fase 3 - Edificio 3: progettazione esecutiva	Lotto 1 Data Center	A	17	3	19	art. [●], c. 6, lett. c)	Ordine e consistenza delle fasi modificabili
1.11	Fase 3 - Edificio 3: istanza e rilascio del titolo abilitativo	Lotto 1 Data Center	A	20	2	21	art. 12, c. 1	Attiva la quota di contributo volontario e standard qualitativo
1.12	Fase 3 - Edificio 3: realizzazione opere interne	Lotto 1 Data Center	A	22	5	26	art. 7, c. 2	
1.13	Fase 3 - Edificio 3: SCIA di agibilità	Lotto 1 Data Center	M	27		27	art. 7, c. 3	Richiede urbanizzazioni funzionali collaudate
1.14	Fase 4 - Edificio 4: progettazione esecutiva	Lotto 1 Data Center	A	28	3	30	art. [●], c. 6, lett. d)	Ordine e consistenza delle fasi modificabili
1.15	Fase 4 - Edificio 4: istanza e rilascio del titolo abilitativo	Lotto 1 Data Center	A	31	2	32	art. 12, c. 1	Attiva la quota di contributo volontario e standard qualitativo
1.16	Fase 4 - Edificio 4: realizzazione opere interne	Lotto 1 Data Center	A	33	5	37	art. 7, c. 2	
1.17	Fase 4 - Edificio 4: SCIA di agibilità	Lotto 1 Data Center	M	38		38	art. 7, c. 3	Richiede urbanizzazioni funzionali collaudate
2	**OPERE DI URBANIZZAZIONE**	**Opere di urbanizzazione**	**G**	**2**	**11**	**12**		
2.1	Viabilità pubblica interna al comparto	Opere di urbanizzazione	A	8	4	11	art. 9, c. 1, lett. a)	Urbanizzazione primaria, non a scomputo
2.2	Parcheggio pubblico in superficie	Opere di urbanizzazione	A	10	3	12	art. 9, c. 2, lett. b)	Urbanizzazione secondaria
2.3	Parco: progettazione esecutiva e approvazione del progetto	Parco urbano territoriale	A	2	3	4	art. 9, c. 2, lett. a)	Subordinato ad approvazione e pareri degli enti
2.4	Bonifica del lotto e certificazione di avvenuta bonifica	Parco urbano territoriale	A	5	3	7	art. 9, c. 2, lett. a)	Presupposto inderogabile per l'avvio dei lavori
2.5	Parco: esecuzione dei lavori	Parco urbano territoriale	A	8	3	10	art. [●], cc. 10-12	Avvio programmato con la Fase 1 del Lotto 1
3	**LOTTO 2a - TECH HUB**	**Lotto 2a Tech Hub**	**G**	**2**	**37**	**38**		
3.1	Commercializzazione e individuazione degli utilizzatori finali	Lotto 2a Tech Hub	A	2	12	13	art. [●], c. 14, lett. a)	Tempistica non predeterminabile
3.2	Progettazione definitiva ed esecutiva	Lotto 2a Tech Hub	A	15	4	18	art. [●], c. 16	
3.3	Bonifica del lotto e certificazione di avvenuta bonifica	Lotto 2a Tech Hub	A	18	3	20	art. 7, cc. 1 e 2	Presupposto per l'avvio dei lavori
3.4	Istanza e rilascio del primo titolo abilitativo	Lotto 2a Tech Hub	A	18	2	19	art. 5, c. 3, lett. c)	Attiva la quota di contributo volontario e standard qualitativo
3.5	Realizzazione del primo sub-lotto o edificio	Lotto 2a Tech Hub	A	21	5	25	art. [●], c. 15	
3.6	Agibilità del primo sub-lotto o edificio	Lotto 2a Tech Hub	M	26		26	art. 7, c. 3	
3.7	Sub-lotti successivi build-to-suit (progettazione e opere)	Lotto 2a Tech Hub	A	27	12	38	art. [●], c. 15	Subordinati a ulteriori utilizzatori finali
4	**LOTTO 2b - CASCINA CUCCO**	**Lotto 2b Cascina Cucco**	**G**	**4**	**23**	**26**		
4.1	Rilievo, diagnosi strutturale e verifiche preliminari	Lotto 2b Cascina Cucco	A	4	10	13	art. [●], c. 18, lett. c)	Tempistica non predeterminabile
4.2	Definizione delle funzioni da insediare	Lotto 2b Cascina Cucco	A	13	6	18	art. [●], c. 18, lett. d) ed e)	
4.3	Progettazione e rilascio del titolo abilitativo	Lotto 2b Cascina Cucco	A	18	3	20		
4.4	Esecuzione degli interventi di recupero	Lotto 2b Cascina Cucco	A	22	4	25	art. [●], c. 17	Eseguibile in qualunque momento
4.5	Agibilità	Lotto 2b Cascina Cucco	M	26		26	art. [●], c. 18, lett. b)	
5	**TERMINI CONVENZIONALI**	**Obblighi economici**	**G**	**40**	**1**	**40**		
5.1	Termine per la presentazione delle domande di titolo edilizio	Obblighi economici	M	40		40	art. 3, c. 2	Le opere restano ultimabili entro i titoli rilasciati
5.2	Scadenza della validità del Piano Attuativo e della convenzione	Obblighi economici	M	40		40	art. 3, c. 1	Unico termine finale vincolante

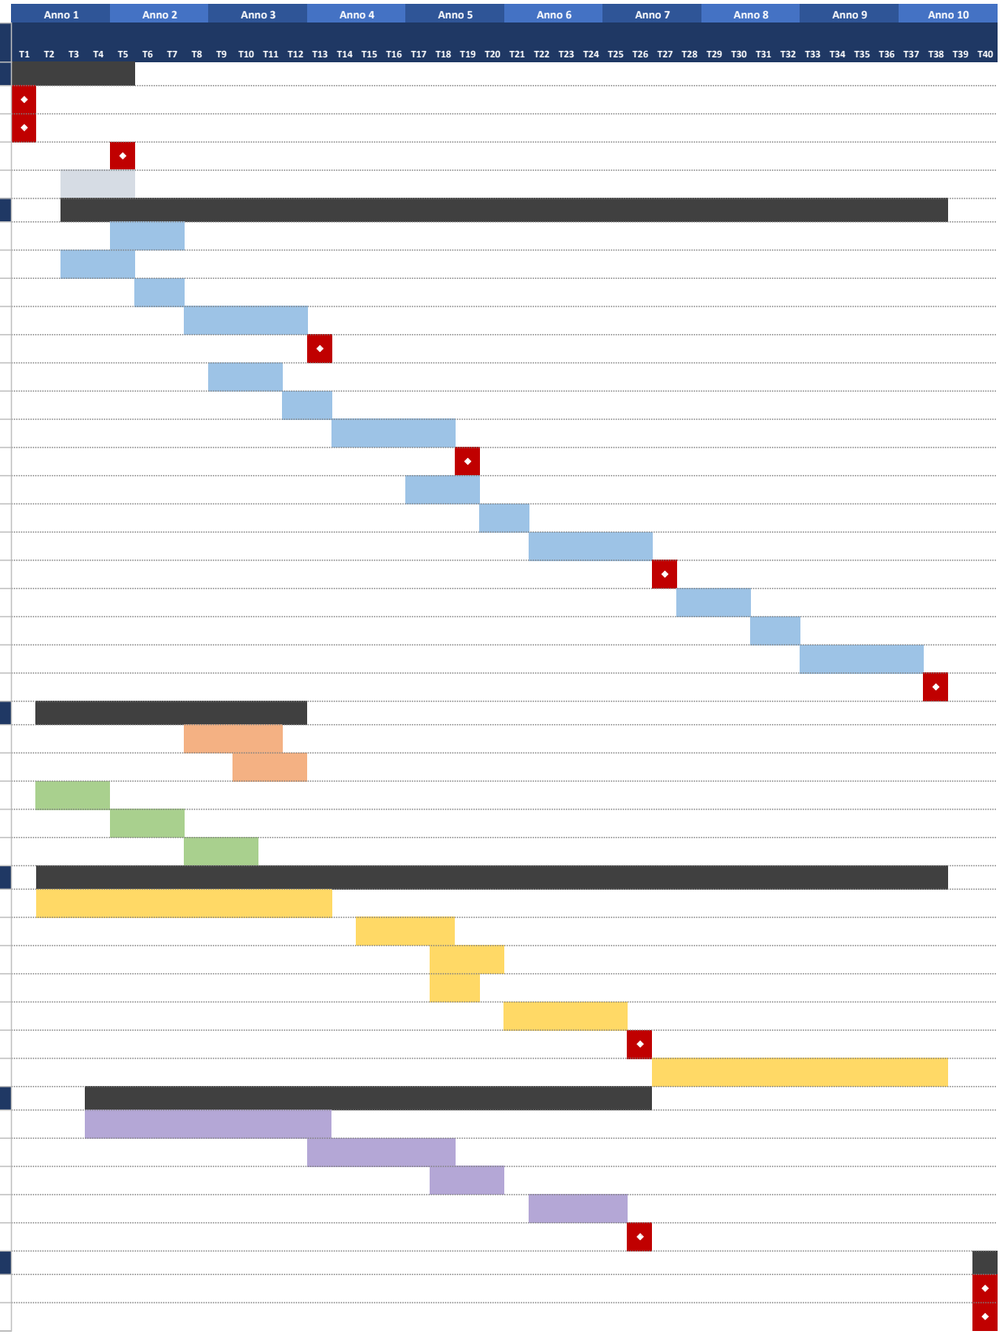

Note

Le durate precompilate sono ipotesi parametriche, non desunte da elaborati di progetto: vanno validate con la direzione tecnica, il general contractor e i gestori delle reti. Le sequenze rappresentate non costituiscono termini essenziali né perentori.

Il cronoprogramma dipende anche dai tempi dei procedimenti di competenza di amministrazioni ed enti terzi (a titolo esemplificativo, VIA nazionale): ha pertanto carattere meramente indicativo e riflette le previsioni formulate alla data di redazione del presente elaborato, senza costituire impegno vincolante per il soggetto attuatore.
